

Bauablauf und Termine

1. Halbjahr 2018

Seite Rudolfstrasse:


- Allg. Vorbereitungsarbeiten und Baustelleninstallationen
- Abbrüche
- Installation Kran Nord
- Aushub/Baugrubensicherung
- prov. Umlegung Werkleitungen
- Steg und Unterfangungen entlang Rudolfstrasse 17/19

Im Gleisfeld:

- Bau Passerelle

Seite Bahnhofplatz:

- Umlegung Werkleitungen Turnerstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung

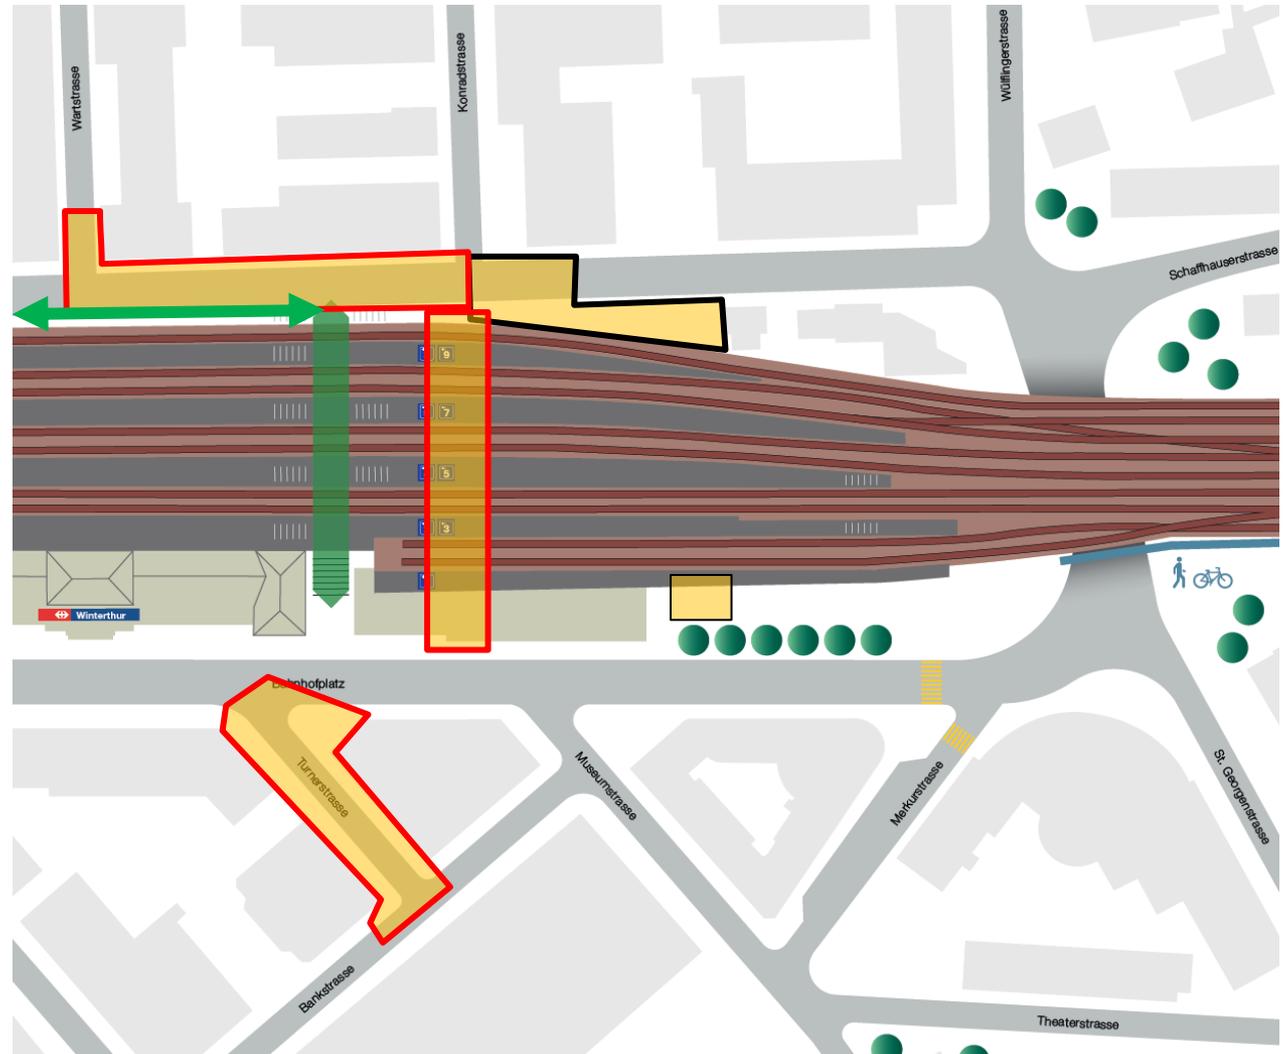

2. Halbjahr 2018

Seite Rudolfstrasse:


- Logistikplattformen
- Installation Kran Süd
- Werkleitungen unterhalb Velostation
- Betonarbeiten an Velostation

Im Gleisfeld:

- Einbau Bauhilfsmassnahmen
- Aushub/Baugrubensicherung

Seite Bahnhofplatz:

- Unterfangung Aufnahmegebäude SBB
- Logistikplattform und Kran Bankstrasse
- Umlegung Werkleitungen Bankstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung

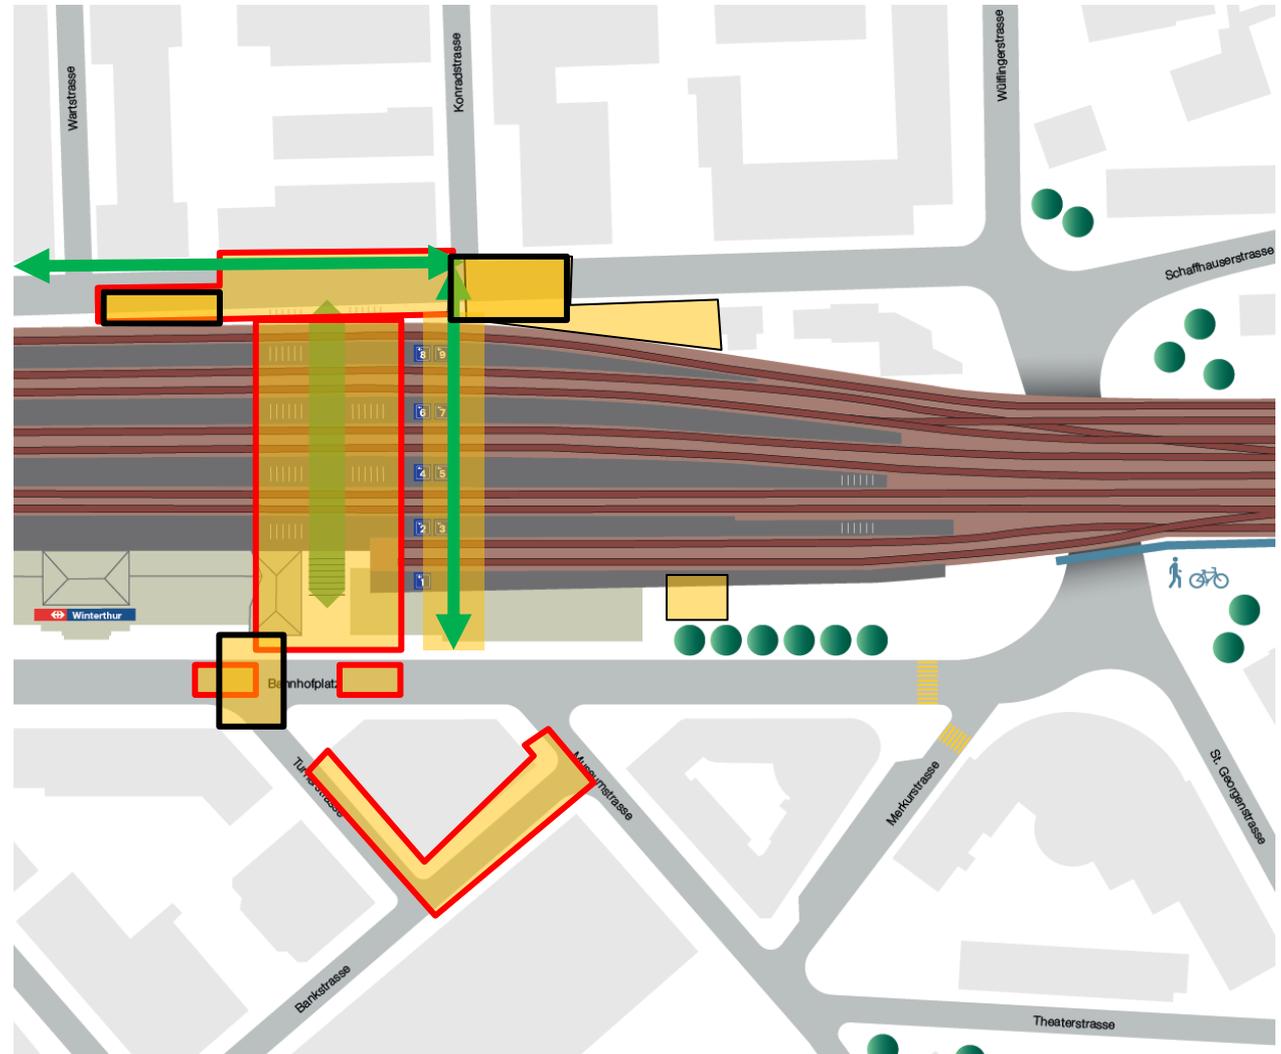

1. Halbjahr 2019

Seite Rudolfstrasse:


- Betonarbeiten Velostation
- Verlegung Werkleitungen oberhalb Velostation
- Auffüllung Baugrube und Rückbau Fussgängersteg im Bereich Rudolfstrasse 17/19

Im Gleisfeld:

- Aushub/Baugrubensicherung
- Rohbau/Betonarbeiten

Seite Bahnhofplatz:

- Unterfangung Aufnahmegebäude SBB
- Aushub/Baugrubensicherung Velorampe und Unterquerung Bahnhofplatz
- Rohbau/Betonarbeiten Velorampe und Unterquerung Bahnhofplatz

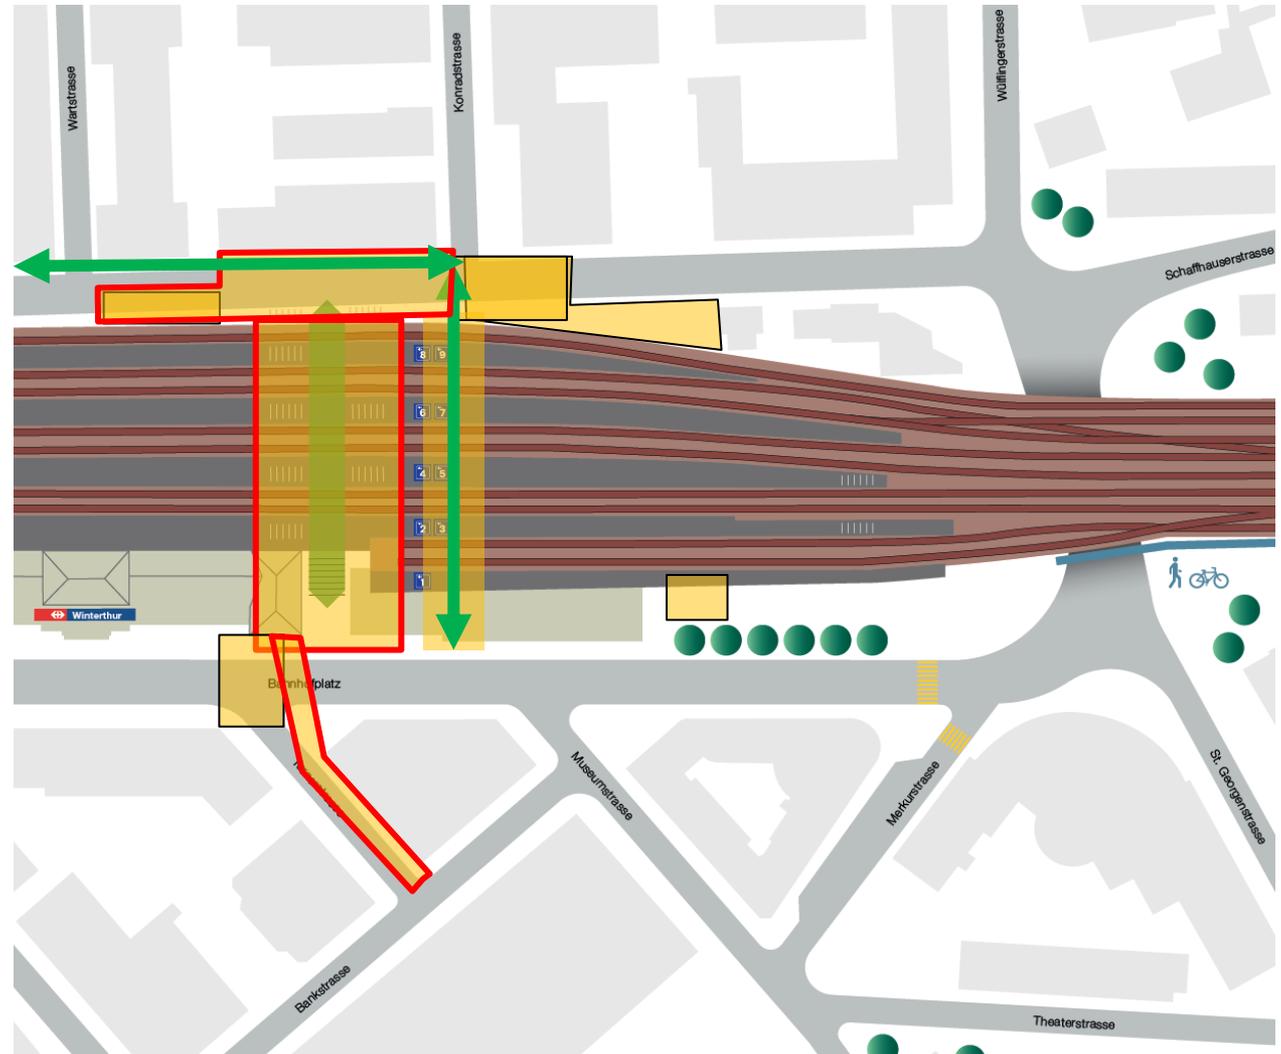

2. Halbjahr 2019

Seite Rudolfstrasse:


-

Im Gleisfeld:


- Rohbau/Betonarbeiten

Seite Bahnhofplatz:

- Rohbau/Betonarbeiten
Aufnahmegebäude SBB
- Aushub/Baugrubensicherung
Velorampe und Unterquerung
Bahnhofplatz
- Rohbau/Betonarbeiten
Velorampe und Unterquerung
Bahnhofplatz

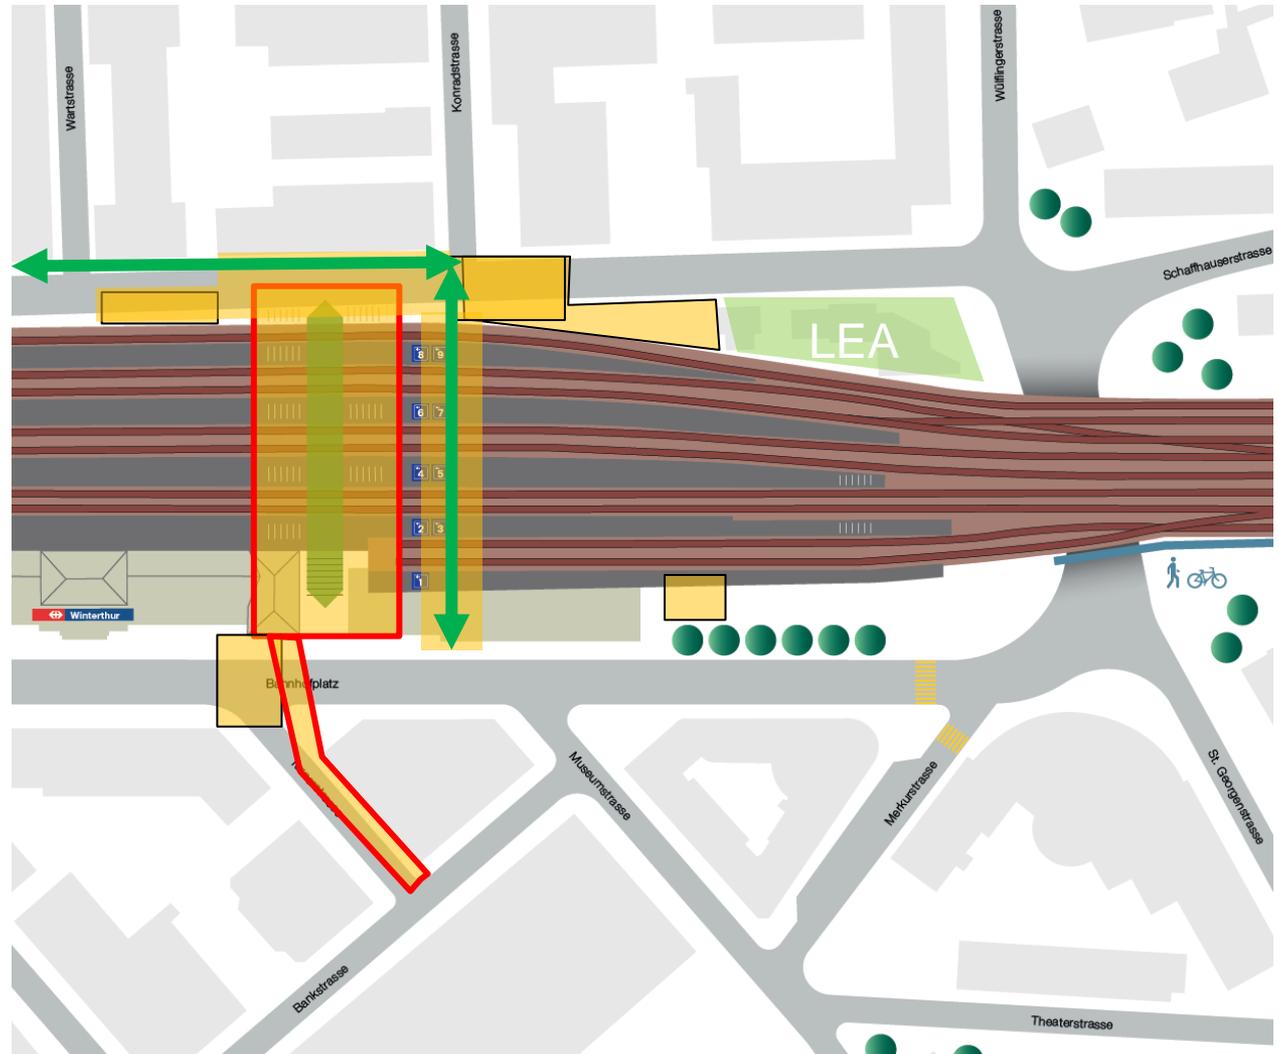

1. Halbjahr 2020

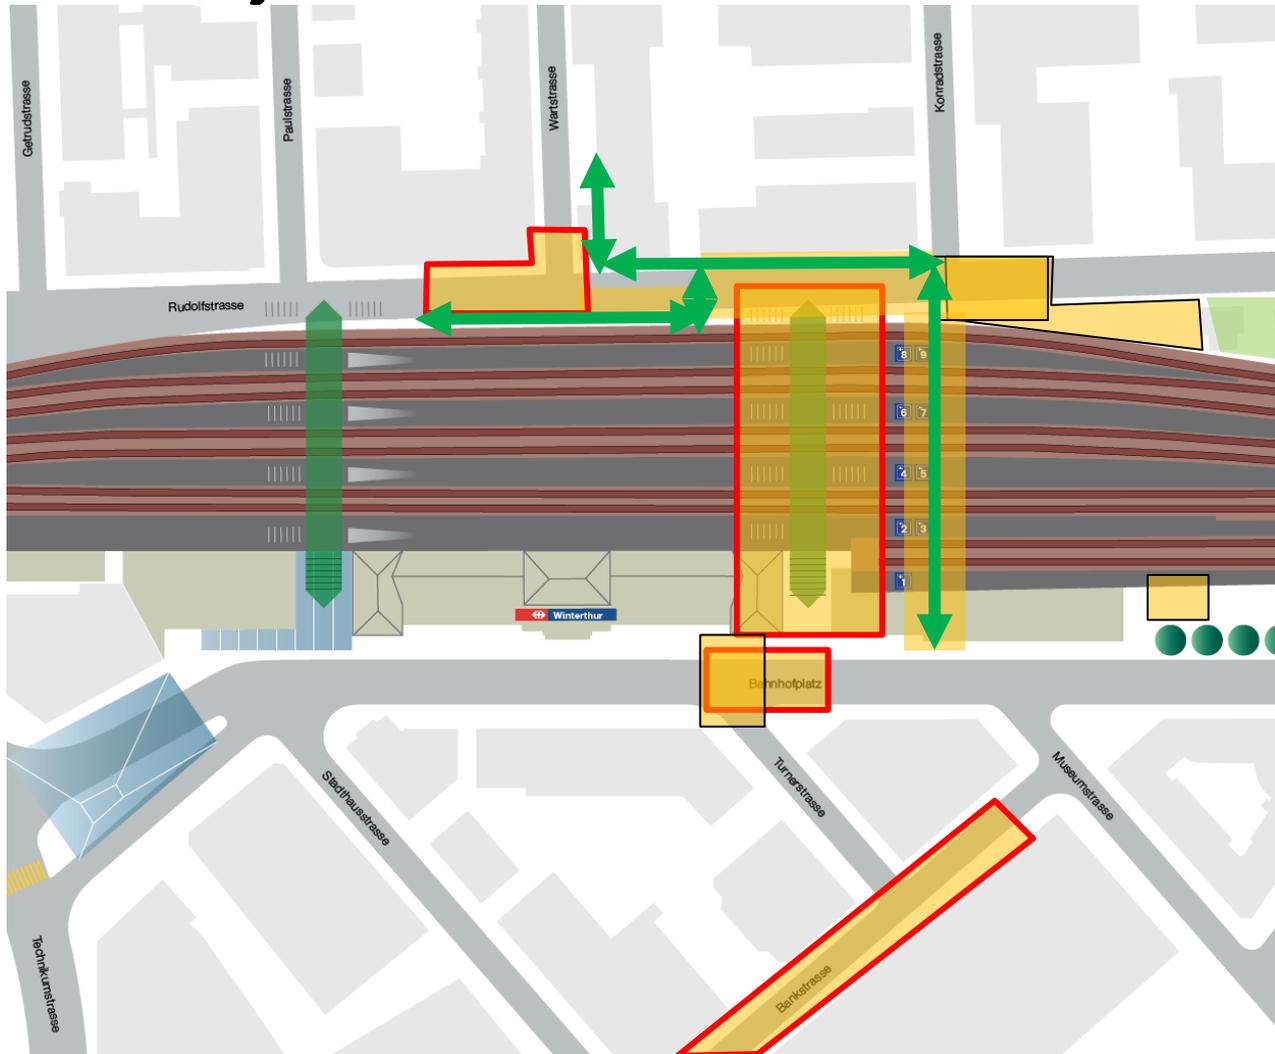

Seite Rudolfstrasse:

- Fussgängersteg gleisseitig auf Höhe Wartstrasse 2
- Prov. Umlegung Werke
- Unterfangung Rudolfstr. 15
- Demontage Logistikplattform Süd


Im Gleisfeld:

- Rohbau/Betonarbeiten
- Ausbau Bauhilfsmassnahmen

Seite Bahnhofplatz:

- Rohbau/Betonarbeiten Aufnahmegebäude SBB
- Umleitung Werkleitungen Bankstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung
- Oberflächeninstandstellung

2. Halbjahr 2020

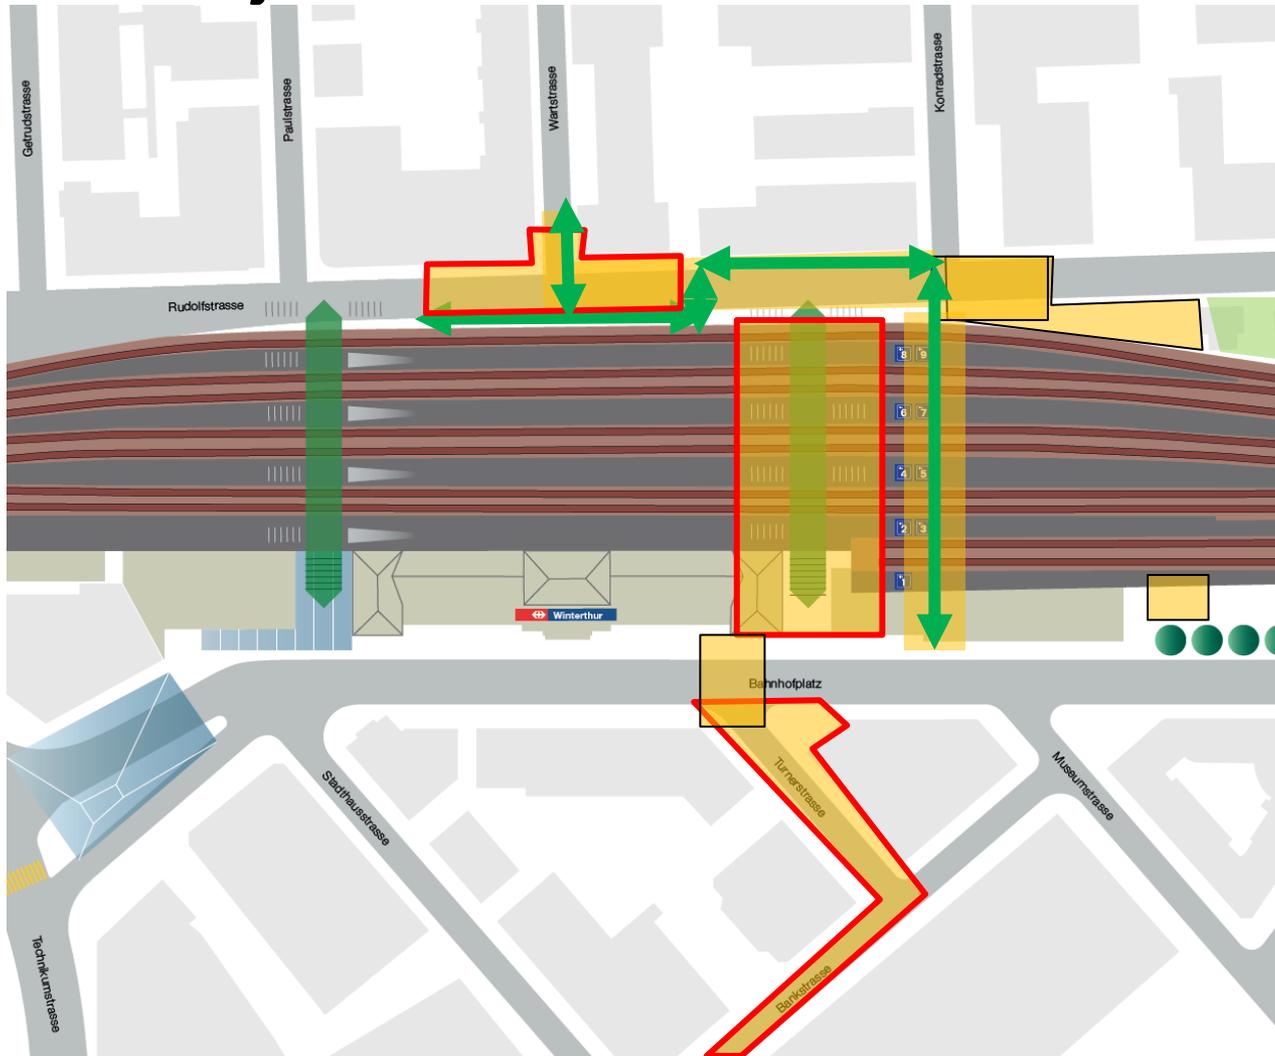

Seite Rudolfstrasse:

- Abbrüche
- Baugrube Wartstrasse 2 bis Rudolfstrasse 15
- Fussgängersteg und Hilfsbrücke vor Rudolfstr. 17a
- Verlegung Werkleitungen unterhalb Velostation
- Erstellung Kanalisation
- Betonarbeiten Velostation


Im Gleisfeld:

- Rohbau/Betonarbeiten
- Ausbau
- Bauhilfsmassnahmen

Seite Bahnhofplatz:

- Umlegung Werkleitungen
- Belagsarbeiten ganzer Perimeter
- Oberflächeninstandstellung

1. Halbjahr 2021

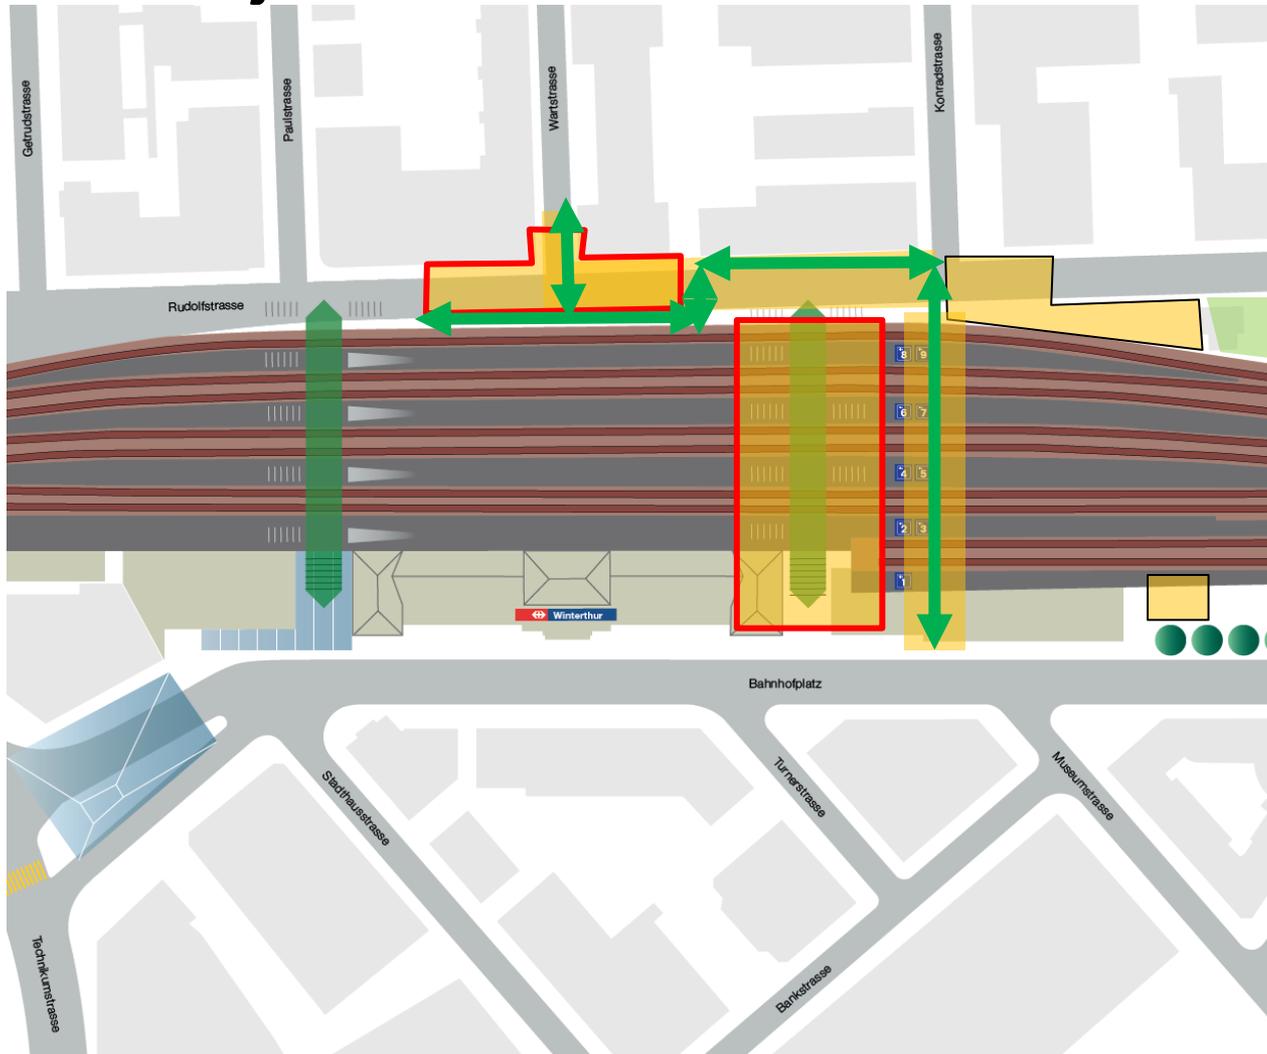

Seite Rudolfstrasse:

- Demontage Kran Süd
- Demontage Logistikplattform Nord
- Verlegung Werkleitungen oberhalb Velostation
- Rückbau Provisorien
- Abschluss Rohbau/Betonarbeiten
- Auffüllung Baugrube
- Beginn Strassenbauarbeiten

Im Gleisfeld:

- Abschluss Rohbau/Betonarbeiten
- Innenausbau PU Nord und Veloquerung
- Fertigstellungsarbeiten

Seite Bahnhofplatz:

- Demontage Logistikplattform und Kran Bahnhofplatz

1. Halbjahr 2022

Seite Rudolfstrasse:

- Allg. Fertigstellungsarbeiten
- Demontage Kran Rudolfstr. Nord

Im Gleisfeld:

- Allg. Fertigstellungsarbeiten
- Rückbau Passerelle

Seite Bahnhofplatz:

-

